


Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishanke

Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
25.11.2022

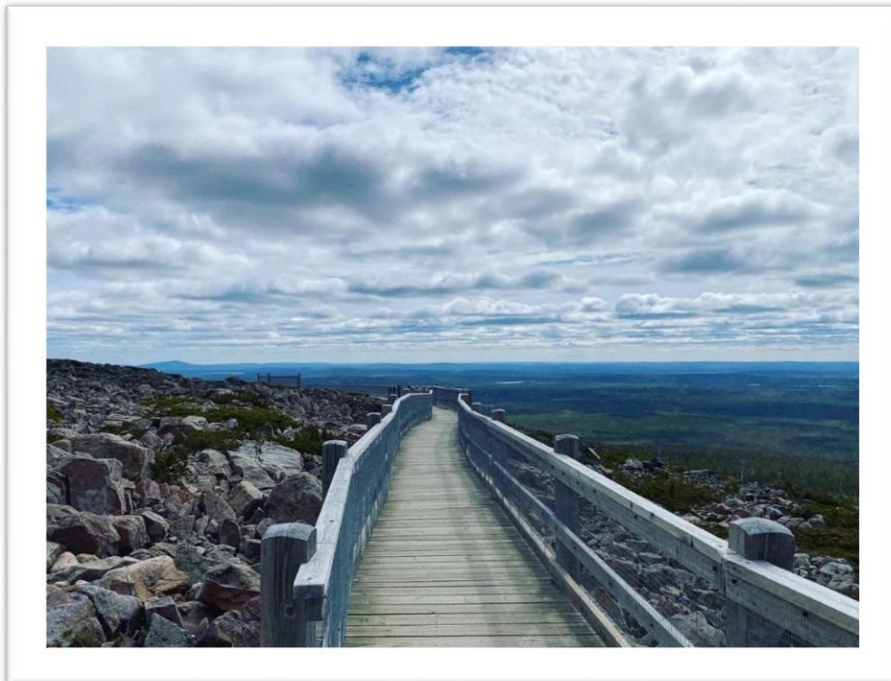

Ohjausryhmän 2. kokous 25.11.2022

Pöytäkirja

Aika 25.11.2022 klo 8.30

Paikka Teams

Läsnä Anne Lindholm, ohjausryhmän valvoja, Lapin ELY-keskus (klo 8.35 alkaen)
Pii Lindholm, Lapin ELY-keskus
Sanna Kivilompolo, Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Eila Örn, Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Otto Suopajarvi, Kittilän kunnan tekninen osasto, kunnan infra
Toni Juuti, Kittilän kunnan tekninen osasto, maankäyttö ja kaavoitus
Saana Veltheim, Kittilän kunnanhallitus
Janne Leinonen, Alakylän vesihuolto-osuuskunta
Jouko Vuolli, Kelontekemän vesihuolto-osuuskunta
Seppo Kantola, Kinisjärven vesiosuuskunta
Mikael Mannersuo, Ylläksen yhdyskuntatekninen huolto Oy
Matti Tikkanen, Kaukosen vesiosuuskunta

§ 1 Kokouksen avaaminen

Ympäristötarkastaja Sanna Kivilompolo toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 8.30.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen puheenjohtaja, sihteerit ja pöytäkirjantarkastajat sekä äänenlaskijat

Puheenjohtajaksi valittiin Sanna Kivilompolo, sihteeriksi Eila Örn ja pöytäkirjantarkastajiksi (toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina) Saana Veltheim ja Janne Leinonen.

4 § Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishankkeen varsinainen hankesuunnitelma

Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 24.8.2022 § 6 päätettiin muuttaa suojelusuunnitelman hankesuunnitelmaa merkittävästi. Kirjalliseen pohjatietoon sekä tarvittaviin lisätutkimuksiin perustuen laaditaan suojelusuunnitelmat yhdeksälle pohjavesialueelle. Laatimishankkeen toteutukseen esitettiin selvitettäväksi kunnalle palkattavan asiantuntijan ja konsulttiyrityksen vertailu.

Vertailukohta	Konsulttiyritys	Palkattu asiantuntija
Kustannus	9 pohjavesialueen taustamateriaalien läpikäynti, riskikohteiden kartoitus sekä maastokäynnit yht. 18 000 € (2 000 €/alue) + Raportointi ja toimistokulu ~ 5 000 € YHTEENSÄ: 23 000 € Lisätutkimuksiin jäävä rahoitus: 7 000 €	3 kuukauden työpanos: 1,5 kuukautta pohjavesialueiden taustamateriaalien läpikäyntiin, riskikohteiden kartoitukseen sekä maastokäynteihin ja lisätutkimusten tilaamiseen + 1,5 kuukautta varsinaisen suojelusuunnitelman laatimiseen YHTEENSÄ: 18 000 € Lisätutkimuksiin jäävä rahoitus: 12 000 €
Saatavuus	Varma	Epävarma
Asiantuntijuus	Varma	Hieman epävarma, riippuu työpaikan hakijoiden kokemuksesta
Suunnitelman hyödynnettävyys	Suojelusuunnitelma luultavasti yleisluontoisempi	Suojelusuunnitelma mahdollisesti kohdennetumpi sekä kohdekohtaisesti yksityiskohtaisempi
Tiivistelmä	Konsulttiyrityksen kautta tilattu suojelusuunnitelma on kalliimpi ja luultavasti palkatun asiantuntijan laatimaa suunnitelmaa yleisluontoisempi. Toisaalta palkatun asiantuntijan saatavuus kunnalle on epävarmaa ja palkattavan asiantuntijan asiantuntijuus pohjavesien suojelusta riippuu hakijoiden aiemmasta opintotaustasta sekä työkokemuksesta.	

Ympäristötarkastajan esitys:

Ohjausryhmä hyväksyy esitetyn varsinaisen hankesuunnitelman, jossa esitetty toteuttamistapa on asiantuntijan palkkaaminen.

Tekninen toimi (tekninen johtaja, esittelijä ja tekninen lautakunta) vastaa asiantuntijan palkkauksesta (määräaikainen toimi, vesihuollon ja -talouden kehittämisasiantuntija) ja suojelusuunnitelman laatimiseen käytettävän työajan (3 750 €/kk + henkilöstökulut) mukainen palkka osoitetaan asiantuntijalle laatimishankkeelta. Arvioitu asiantuntijan palkkaamisen kokonaiskustannus hankkeelle on yhteensä 18 000 €. Tällöin tarvittaviin lisätutkimuksiin jää 12 000 €.

Mikäli asiantuntijaa ei saada palkattua keväällä 2023, ympäristötarkastaja kutsuu ohjausryhmän viipymättä koolle ja valmistelee esiteltäväksi hankkeen vaihtoehtoiset toteutustavat.

Kaukosen vesiosuuskunta esittää:

Hankesuunnitelmaan Kotikankaan osalta ehdotamme (hallitus) seuraavaa tekstiä:

Kaukosen kylällä sijaitseva Kotikankaan pohjavesialue valittiin prioriteettikohteisiin sekä sijainti-että päästöriskin perusteella. Pohjavesialue sijaitsee Ounasjoen tulva-alueella, mikä aiheuttaa vuosittain varajärjestelmän käyttöä. Pohjaveden muodostumisalueella on mahdollisia

päästöriskejä, kuten ravirata. Alueella on myös ollut aiempia maa-aineisten ottolupia sekä mahdollisesti luvatonta ottoa, joiden johdosta alueella on maisemoimattomia liian syväksi otettuja soramonttuja, joissa pohjavesi nousee ajoittain maanpintaan muodostaen mahdollisen pilaantumisriskin.

Valtatie 79:n linjan muutos 2014 entistä keskeemmälle pohjavesialuetta lisäsi liikeonnettomuuksien aiheuttamia riskejä (esim. polttoainekuljetukset). Liikenneonnettomuuden ja tulvan aiheuttamien vahinkojen torjumiseksi alueelle on rakennettu suojavaalli, joka on liian matala.

Valtatie 79 linjan muutoksen vaikutuksia pohjaveden määrään ja laatuun ei ole selvitetty riittävästi. Alue ei sijaitse kaavoitetulla alueella.

Päätös:

Päätettiin hyväksyä varsinainen hankesuunnitelma lisättynä Kaukosen vesiosuuskunnan esityksellä luokitella Kotikankaan pohjavesialue prioriteettikohteeksi sekä sijainti- että päästöriskin perusteella ja lisätä esitysteksti hakesuunnitelmaan.

5 § Muut asiat

Lapin pelastuslaitoksen edustaja puuttuu edelleen ohjausryhmästä henkilöstömuutosten vuoksi.

6 § Seuraava kokouspäivä ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.49.

Kittilässä 25.11.2022

Sanna Kivilompolo
Puheenjohtaja

Eila Örn
Sihteeri

Saana Veltheim
Pöytäkirjantarkastaja

Janne Leinonen
Pöytäkirjantarkastaja
